



Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie

2026-2028

Olst-Wijhe, 10 maart 2026

Inhoudsopgave

1	Samenvatting	3
2	Inleiding.....	3
3	Overzicht acties	5
3.1	Realiserend	5
3.2	Regulerend	6
3.3	Samenwerkend.....	9
3.4	Ondersteunend.....	13
4	Financiën.....	19
5	Communicatie en participatie	20
6	Monitoring	21
7	Bronnenlijst	22

1 Samenvatting

Het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie 2026 - 2028 bouwt voort op het beleidsplan Klimaatadaptatie (bron 1), dat op 2 maart 2026 door de raad is vastgesteld. Het Uitvoeringsprogramma geeft nader invulling aan onze doelen en beschrijft welke acties we in deze periode gaan uitvoeren (H3). Om die acties uit te kunnen voeren, beschrijven we welke capaciteit en middelen er nodig zijn (H4), hoe we communiceren en de samenleving betrekken (H5).

2 Inleiding


In de afgelopen periode zijn nieuwe inzichten ontstaan en is het beleidslandschap rondom het thema klimaatadaptatie op landelijk, regionaal en lokaal niveau veranderd. De ambitie rondom klimaatadaptatie is in hoofdlijnen opgenomen in de omgevingsvisie. Deze omgevingsvisie is in het voorjaar van 2025 vastgesteld (bron 2). Hierin staat dat Olst-Wijhe in 2050 een 'waterrijke en groene' gemeente is en het principe 'water en bodem sturend' de basis vormt bij ruimtelijke ontwikkelingen. We zetten ons in op de thema's hittestress, wateroverlast, droogte, gevolgenbeperking overstromingen en biodiversiteit. Dat deze doelen en uitgangspunten belangrijk zijn, onderschrijven ook de nieuwste KNMI'23-klimaatscenario's (bron 3). Deze laten zien dat we te maken krijgen met hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, heviger buien en drogere zomers.

Deze ontwikkelingen resulteerden in de evaluatie van het rapport Klimaatadaptatie Olst-Wijhe: knelpuntenanalyse, uitvoeringsprogramma & routekaart 2020 – 2026 en in de herijking van de strategie Klimaatadaptatie (ook wel het *beleidsplan Klimaatadaptatie Olst-Wijhe*). In het beleidsplan Klimaatadaptatie zijn zes stappen vastgelegd.

1. We pakken knelpunten voor wateroverlast en hittestress in de openbare ruimte actief aan.
2. We gaan het groen in de openbare ruimte ecologisch verantwoord beheren.
3. We stellen elke twee jaar een uitvoeringsagenda op met concrete acties en communicatie richting inwoners, partners en bedrijven.
4. We borgen de regionale richtlijnen voor klimaatadaptief ontwikkelen in de Omgevingsprogramma's.
5. We scherpen de eisen in het PVE Openbare Ruimte aan voor een groenere en klimaatbestendige openbare ruimte.
6. We ontwikkelen een puntensysteem voor natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen en borgen deze in het Omgevingsplan.

Stap 3 vormt daarmee de basis voor het voorliggende Uitvoeringsprogramma. Waar het *beleidsplan Klimaatadaptatie Olst-Wijhe* (bron 1) de beleidsmatige kaders beschrijft, richt dit Uitvoeringsprogramma zich op acties die op korte termijn bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast, het tegengaan van hittestress en droogte en het versterken van biodiversiteit (figuur 1). Denk aan initiatieven zoals het ophalen van tegels met de tegeltaxi, ondersteuning bij het afkoppelen van regenpijpen en het bijstellen van

het lokale hitteplan. Daarnaast beschrijven we in dit Uitvoeringsprogramma hoe we bewoners, bedrijven en maatschappelijke partners actief betrekken bij de opgave. Het Uitvoeringsprogramma vormt tevens de basis voor communicatie over klimaatadaptatie, zodat inwoners, bedrijven en organisaties in Olst-Wijhe beter geïnformeerd worden over de gevolgen van extreem weer en wat zij zelf kunnen doen in hun eigen tuin en buurt om zich hier beter op voor te bereiden.

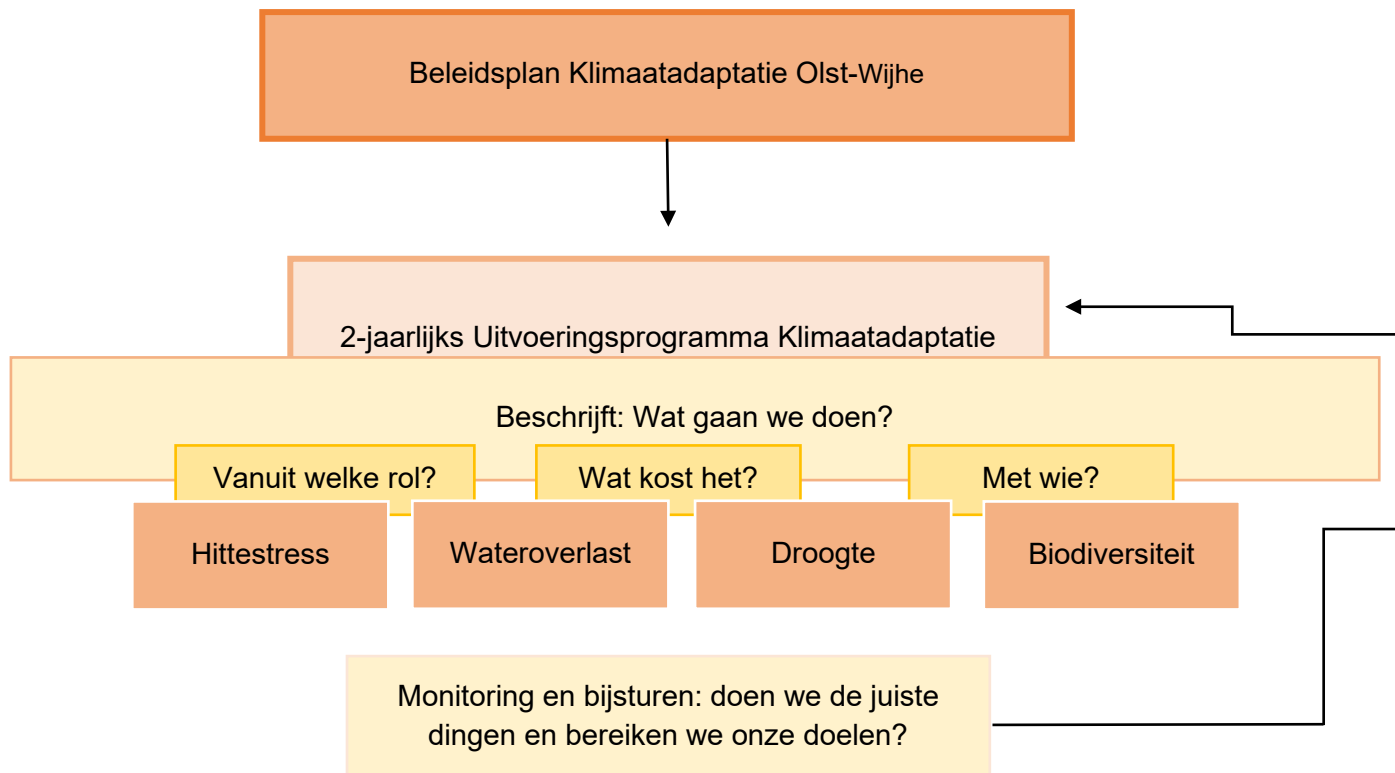

Figuur 1: Overzicht focus Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Olst-Wijhe

3 Overzicht acties

In dit hoofdstuk staan de acties voor de komende 2 jaar, waarmee we de ambities uit het beleidsplan Klimaatadaptatie willen waarmaken. De gemeente pakt klimaatadaptatie op vanuit vier complementaire rollen: samenwerkend, realiserend, regulerend en ondersteunend (bron 4). Ook benoemen we de planning, de rol van de gemeente en de interne en externe samenwerkingspartners. Waar bij de planning 'doorlopend' staat, bedoelen we gedurende de programmaperiode (2026-2028). Hieronder omschrijven we op hoofdlijnen per rol wat er de komende twee jaar uitgevoerd wordt.

3.1 Realiserend

De gemeente neemt zelf maatregelen en investeert in klimaatadaptieve inrichting van de openbare ruimte. We beschrijven wat we gaan doen in de acties hieronder.

1. Aanpakken van knelpunten in de openbare ruimte	
Omschrijving	Aan de hand van de lijst met alle knelpuntlocaties (onderzoeksresultaten SWEKO, bijlage 1) wordt een prioriteringslijst opgesteld. Daarbij wordt gekeken welke locaties in de openbare ruimte aangepakt worden bij geplande renovaties en welke locaties los hiervan moeten worden aangepakt. Hiermee richten we de buitenruimte klimaatadaptief in, zodat wateroverlast en hittestress afnemen en de biodiversiteit toeneemt. De focus voor dit Uitvoeringsprogramma ligt op het aanpakken van 2 of 3 locaties.
Eigenaar	Beleidsmedewerker Klimaatadaptatie
Rol gemeente	Realiserend
Interne partners	BOR
Externe partners	N.v.t.
Relatie met andere programma's/projecten	MJIP
Tijdsplanning	Doorlopend, nader te bepalen per project.
Benodigde middelen	Voor deze actie is het benodigde budget op dit moment nog niet bekend (PM). Aanvullend budget zal ter zijner tijd ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.
Risico('s)	Interne capaciteit bij BOR/PM

2. Ecologisch beheer openbare ruimte	
Omschrijving	We gaan het groen in de openbare ruimte ecologisch verantwoord beheren.
Eigenaar	Beleidsmedewerkers groen en groenbeheer
Rol gemeente	Realiserend
Interne partners	Klimaatadaptatie
Externe partners	ROVA
Relatie met andere programma's/projecten	Groenbeleidsplan
Tijdsplanning	Nader te bepalen (nog op te starten).
Benodigde middelen	De financiering hiervan wordt bekeken binnen de totale vergroeningsopgave.
Risico('s)	Interne capaciteit bij BOR/uitvoering

3.2 Regulerend

We geven uitvoering aan de ambities gesteld in het Beleidsplan Klimaatadaptatie. We stellen juridisch bindende regels en kaders om klimaatadaptatie te borgen in ontwikkelingen en in hoe we omgaan met de openbare ruimte.

3. Borgen van regionale maatlat in Omgevingsprogramma's	
Omschrijving	De regionale maatlat klimaatadaptatie vormt de basis voor het thema klimaatadaptatie in de Omgevingsprogramma's (bijlage 2). Deze richtlijnen worden verder afgestemd op de specifieke kenmerken van elk gebied.
Eigenaar	Beleidsmedewerker klimaatadaptatie
Rol gemeente	Regulerend
Interne partners	
Externe partners	RIVUS
Relatie met andere programma's/projecten	Omgevingsprogramma, Uitvoeringsprogramma RIVUS
Tijdsplanning	Nader te bepalen (nog op te starten).
Benodigde middelen	De benodigde inzet past binnen de bestaande formatie en ambtelijke uren.
Risico('s)	

4. Aanscherpen eisen in PvE Openbare Ruimte	
Omschrijving	De gemeente Olst-Wijhe scherpt de eisen voor klimaatadaptatie aan binnen het PvE Openbare Ruimte volgens de doelen uit de Omgevingsvisie. Hiermee richten we de

	openbare ruimte klimaatbestendig in, zodat deze veilig en prettig blijft om in te verblijven en bewegen.
Eigenaar	Beleidsmedewerkers groen en groenbeheer
Rol gemeente	Regulerend
Interne partners	Klimaatadaptatie
Externe partners	ROVA
Relatie met andere programma's/projecten	PvE Openbare Ruimte
Tijdsplanning	Nader te bepalen (nog op te starten).
Benodigde middelen	De benodigde inzet past binnen de bestaande formatie en ambtelijke uren.
Risico('s)	Interne capaciteit bij BOR/uitvoering

5. Ecologisch groenbeheerplan opstellen

Omschrijving	We gaan een ecologisch groenbeheerplan opstellen waarin keuzes verder worden gespecificeerd.
Eigenaar	Beleidsmedewerkers groen en groenbeheer
Rol gemeente	Regulerend
Interne partners	Klimaatadaptatie
Externe partners	ROVA
Relatie met andere programma's/projecten	PvE Openbare Ruimte, Groenbeheersplan/Groenbeleid
Tijdsplanning	Nader te bepalen (nog op te starten).
Benodigde middelen	De financiering hiervan wordt bekeken binnen de totale vergroeningsopgave.
Risico('s)	Interne capaciteit bij BOR/uitvoering, externe capaciteit (ecoloog)

6. Ontwikkelen puntensysteem en borgen in Omgevingsplan

Omschrijving	We borgen een puntensysteem voor natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen in het Omgevingsplan. Zo wordt juridisch geborgd dat bij elke nieuwe ruimtelijke ontwikkeling maatregelen worden genomen om wateroverlast en hittestress te voorkomen en de biodiversiteit te versterken.
Eigenaar	Beleidsmedewerker Klimaatadaptatie
Rol gemeente	Regulerend
Interne partners	Team Ruimte & Samenleving
Externe partners	
Relatie met andere programma's/projecten	Omgevingsprogramma

Tijdsplanning	Nader te bepalen (nog op te starten).
Benodigde middelen	€500
Risico('s)	

7. Hitteplan

Omschrijving	We stellen een lokaal hitteplan vast. Een lokaal hitteplan is een aanvulling op het nationale hitteplan. In het hitteplan omschrijven we welke acties nodig zijn om schade en overlast te voorkomen. De focus ligt op kwetsbare groepen. Het hitteplan wordt jaarlijks geëvalueerd en stapsgewijs uitgebreid met belangrijke stakeholders (zoals zorginstellingen, GGD, veiligheidsregio etc.).
Eigenaar	Beleidsmedewerker klimaatadaptatie
Rol gemeente	Regulerend
Interne partners	Beleidsmedewerkers zorg en veiligheid
Externe partners	CoP Hitte, RIVUS
Relatie met andere programma's/projecten	GALA
Tijdsplanning	Doorlopend
Benodigde middelen	€10.000
Risico('s)	Interne capaciteit

8. Monitoringsdashboard bouwen

Omschrijving	Een digitaal dashboard realiseren dat de voortgang van klimaatadaptatieve maatregelen in Olst-Wijhe meetbaar maakt. Zo ontstaat een instrument om voortgang te volgen, tijdig bij te sturen en input te leveren voor de evaluatie van zowel het Beleidsplan als het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie.
Eigenaar	Beleidsmedewerker klimaatadaptatie
Rol gemeente	Regulerend
Interne partners	Data
Externe partners	Talentenregio
Relatie met andere programma's/projecten	Plan van aanpak Datagedreven werken in Olst-Wijhe
Tijdsplanning	Nader te bepalen (nog op te starten).
Benodigde middelen	€2.500
Risico('s)	

3.3 Samenwerkend

De gemeente zoekt actief de samenwerking met andere partijen op. We werken samen aan een klimaatbestendig Olst-Wijhe. Hieronder staan de acties vanuit de samenwerkende rol beschreven.

9. Samenwerking RIVUS	
Omschrijving	RIVUS richt zich met name op initiëren, afstemming, onderzoek en kennisdeling. Dat doen we nu vanuit het huidige uitvoeringsprogramma van de werkregio. We werken toe naar een nieuw Uitvoeringsprogramma voor de werkregio.
Eigenaar	Beleidsmedewerker klimaatadaptatie
Rol gemeente	Samenwerkend
Interne partners	BOR
Externe partners	RIVUS
Relatie met andere programma's/projecten	Uitvoeringsprogramma RIVUS 2021 – 2028
Tijdsplanning	Doorlopend
Benodigde middelen	De benodigde inzet past binnen de bestaande formatie en ambtelijke uren.
Risico('s)	

10. Samenwerking Vitens	
Omschrijving	We werken aan een toekomstbestendige drinkwatervoorziening. Dit doen we in samenwerking met Vitens. We focussen ons op drinkwaterhergebruik, en drinkwater te kort. Binnen dit Uitvoeringsprogramma gaan we de invulling hiervan vormgeven en onderzoeken hoe we dit kunnen doen.
Eigenaar	Beleidsmedewerker klimaatadaptatie
Rol gemeente	Samenwerkend
Interne partners	Beleidsmedewerker(s) economie, BOR en duurzaamheid
Externe partners	Vitens
Relatie met andere programma's/projecten	Uitvoeringsprogramma RIVUS
Tijdsplanning	Doorlopend
Benodigde middelen	Voor deze actie is het benodigde budget op dit moment nog niet bekend (PM). Indien aanvullend budget benodigd is zal dit ter zijner tijd ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.
Risico('s)	

11. Samenwerking woningcorporatie SallandWonen

Omschrijving	In lijn van de prestatieafspraken stemmen SallandWonen en de gemeente koppelkansen af op het gebied van klimaatadaptatie en investeringen in de openbare ruimte.
Eigenaar	Beleidsmedewerker klimaatadaptatie
Rol gemeente	Samenwerkend
Interne partners	BOR, Wonen
Externe partners	SallandWonen
Relatie met andere programma's/projecten	Prestatieafspraken
Tijdsplanning	Doorlopend
Benodigde middelen	€5.000
Risico('s)	

12. Sponsstrategie Sallandse Weteringen

Omschrijving	De regio Zwolle werkt binnen het NOVEX-programma aan een Regionale Sponsstrategie: een lange termijn benadering (richting 2100) om water en bodem leidend te laten zijn in ruimtelijke keuzes. Het eerste uitgewerkte stroomgebied is de Sallandse Weteringen. We onderzoeken hoe we de sponsprincipes kunnen toepassen in nieuwe woningbouwprojecten, zoals Wijhe-Noord.
Eigenaar	Beleidsmedewerker klimaatadaptatie
Rol gemeente	Samenwerkend
Interne partners	Wonen en Landelijk gebied
Externe partners	
Relatie met andere programma's/projecten	Omgevingsvisie Olst-Wijhe
Tijdsplanning	Doorlopend
Benodigde middelen	De benodigde inzet past binnen de bestaande formatie en ambtelijke uren.
Risico('s)	

13. Adviseren bij Omgevingstafel

Omschrijving	We adviseren bij initiatieven die ingebracht worden bij de Omgevingstafel.
Eigenaar	Beleidsmedewerker klimaatadaptatie
Rol gemeente	Samenwerkend
Interne partners	

Externe partners	
Relatie met andere programma's/projecten	Omgevingswet
Tijdsplanning	Doorlopend
Benodigde middelen	De benodigde inzet past binnen de bestaande formatie en ambtelijke uren.
Risico('s)	

14. Projecten en ontwikkelingen

Omschrijving	We adviseren bij projecten en ontwikkelingen en zien toe op het gebruik van het puntensysteem klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen.
Eigenaar	Beleidsmedewerker klimaatadaptatie
Rol gemeente	Samenwerkend
Interne partners	PMA
Externe partners	
Relatie met andere programma's/projecten	
Tijdsplanning	Doorlopend
Benodigde middelen	De benodigde inzet past binnen de bestaande formatie en ambtelijke uren.
Risico('s)	

15. Samenwerking met kennispartners

Omschrijving	We werken samen met kennisinstellingen, zoals Stichting Steenbreek. We nemen deel aan netwerken zoals het Gemeentelijk Netwerk Klimaatadaptatie van de VNG en de Community of Practice Hitte van Samen Klimaat Bestendig. Zo profiteren we van praktische ondersteuning en kennisdeling.
Eigenaar	Beleidsmedewerker klimaatadaptatie
Rol gemeente	Samenwerkend
Interne partners	
Externe partners	Stichting Steenbreek, GNK, CoP
Relatie met andere programma's/projecten	
Tijdsplanning	Doorlopend
Benodigde middelen	€3.267
Risico('s)	

16. Koppelkansen andere beleidsterreinen

Omschrijving	We leggen actief verbinding met andere beleidsvelden (zoals gezondheid en
--------------	---

	energietransitie) om klimaatadaptatie integraal mee te nemen. Denk bijvoorbeeld aan de koelteaanpak in het warmteprogramma, de aanpak op hitte of het beleidsplan spelen. Maar ook aan kansen op het gebied van maatschappelijk vastgoed.
Eigenaar	Beleidsmedewerker klimaatadaptatie
Rol gemeente	Samenwerkend
Interne partners	Cluster Duurzaamheid, beleidsmedewerkers gezondheid en veiligheid
Externe partners	
Relatie met andere programma's/projecten	Warmteprogramma, Beleidsplan Spelen, Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
Tijdsplanning	Doorlopend
Benodigde middelen	De benodigde inzet past binnen de bestaande formatie en ambtelijke uren.
Risico('s)	

17. Onderzoek en kennisdeling

Omschrijving	We voeren waar nodig onderzoeken uit om de klimaatadaptatie opgave beter in beeld te brengen, waarbij zowel de fysieke als de sociale dimensie worden meegenomen. We benutten deze inzichten om beleid, gebiedsprocessen en uitvoering bij te sturen.
Eigenaar	Beleidsmedewerker klimaatadaptatie
Rol gemeente	Samenwerkend
Interne partners	
Externe partners	
Relatie met andere programma's/projecten	
Tijdsplanning	Doorlopend
Benodigde middelen	€20.000
Risico('s)	

3.4 Ondersteunend

De opgave voor klimaatadaptatie pakken we aan met partijen uit de samenleving. De gemeente faciliteert en ondersteunt initiatieven van anderen met advies, procesbegeleiding of financiële steun. De acties hieronder laten zien waar we aan bijdragen en waar we op inzetten.

18. Groenblauwe bedrijventerreinen	
Omschrijving	Bedrijventerrein zijn (meestal) sterk verhard. Dit maakt bedrijventerreinen kwetsbaar voor extreme weersomstandigheden. We ondersteunen bedrijventerreinen bij het in kaart brengen van de kansen. We starten hiervoor een verkenning op in samenwerking met een trainee.
Eigenaar	Beleidsmedewerker klimaatadaptatie
Rol gemeente	Ondersteunend
Interne partners	Beleidsmedewerker economie
Externe partners	Talentenregio
Relatie met andere programma's/projecten	Warmteprogramma
Tijdsplanning	Doorlopend
Benodigde middelen	Voor deze actie is het benodigde budget op dit moment nog niet bekend (PM). Indien aanvullend budget benodigd is zal dit ter zijner tijd ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.
Risico('s)	

19. Tegel eruit, groen er in	
Omschrijving	De actie Tegel eruit, plant erin! wordt twee keer per jaar georganiseerd. Inwoners kunnen tijdens de actie hun tegels verwijderen en gratis gebruikmaken van de Tegeltaxi.
Eigenaar	Beleidsuitvoerend medewerker klimaat & energie
Rol gemeente	Ondersteunend
Interne partners	Buitendienst
Externe partners	Stichting Steenbreek
Relatie met andere programma's/projecten	Groenbeleidsplan
Tijdsplanning	Doorlopend
Benodigde middelen	€2.500
Risico('s)	

20. Erfparadijzen

Omschrijving	We sluiten aan op initiatieven vanuit Stichting Steenbreek, zoals Erfparadijzen. Dit is een landelijke campagne die erfeigenaren bewuster maakt, inspireert en ondersteunt bij het natuurlijk inrichten van hun erf. Want ook in het buitengebied liggen grote kansen voor natuurherstel.
Eigenaar	Beleidsuitvoerend medewerker klimaat & energie
Rol gemeente	Ondersteunende rol
Interne partners	Beleidsmedewerker landelijk gebied
Externe partners	Stichting Steenbreek
Relatie met andere programma's/projecten	Omgevingsvisie
Tijdsplanning	Doorlopend
Benodigde middelen	€2.500
Risico('s)	

21. Tuincoaches

Omschrijving	We zetten een netwerk van Tuincoaches op om inwoners te ondersteunen bij het vergroenen en klimaatadaptief inrichten van hun tuin. De Tuincoaches zijn vrijwilligers met kennis en ervaring en bieden gratis en vrijblijvend advies (vergelijkbaar met een energiecoach), zowel individueel als in groepsverband (bijvoorbeeld op straat- of buurtniveau).
Eigenaar	Beleidsuitvoerend medewerker klimaat & energie
Rol gemeente	Ondersteunende rol
Interne partners	
Externe partners	Nader te bepalen
Relatie met andere programma's/projecten	
Tijdsplanning	Doorlopend
Benodigde middelen	€1.000
Risico('s)	

22. Subsidieregeling Klimaatadaptatie

Omschrijving	Deze subsidie is een gezamenlijk initiatief van alle RIVUS-gemeenten. We ontwikkelen de regeling door n.a.v. periodieke
--------------	---

	evaluaties. Olst-Wijhe is ook de uitvoeringsorganisatie voor de werkregio. We kijken naar uitbreiding van het maatregelpakket en zetten in op communicatie.
Eigenaar	Beleidsmedewerker klimaatadaptatie
Rol gemeente	Ondersteunende rol
Interne partners	Sub-team klimaatadaptatie, BOR
Externe partners	RIVUS
Relatie met andere programma's/projecten	
Tijdsplanning	Doorlopend
Benodigde middelen	€ (reeds gedekt) / Vanaf 2027: mogelijk jaarlijkse bijdrage benodigd aan de uitvoeringsorganisatie van +- € 7.000.
Risico('s)	

23. Afkoppelcoaches

Omschrijving	De gemeente Olst-Wijhe zet de inzet van afkoppelcoaches voort, in samenwerking met de Ulebelt. Deze coaches ondersteunen inwoners en organisaties bij het afkoppelen van regenwater van het riool. Daarnaast kunnen ze inwoners helpen bij het aanvragen van de afkoppelsubsidie. We werken ook samen binnen DOWR om ervaringen te delen en kansen te benutten, zoals met woningcorporatie SallandWonen.
Eigenaar	Beleidsmedewerker klimaatadaptatie i.s.m. beleidsuitvoerend medewerker klimaat & energie
Rol gemeente	Ondersteunende rol
Interne partners	BOR
Externe partners	Ulebelt, DOWR, SallandWonen
Relatie met andere programma's/projecten	Masterplan Hemelwateroverlast, Gemeentelijk Rioleringsplan Olst-Wijhe 2022 - 2028
Tijdsplanning	Doorlopend
Benodigde middelen	€15.000
Risico('s)	

24. Verkoelende leefomgeving (hitteaanpak)

Omschrijving	De Hitte aanpak is onderverdeeld in 3 themalijnen: gebied, gebouw, gezondheid.
--------------	--

	We zetten in op een verkoelende leefomgeving, bijvoorbeeld door het plaatsen van watertappunten.
Eigenaar	Beleidsuitvoerend medewerker klimaat & energie
Rol gemeente	Ondersteunende rol
Interne partners	BOR, Beleidsmedewerker(s) gezondheid
Externe partners	CoP Hitte
Relatie met andere programma's/projecten	GALA
Tijdsplanning	Doorlopend
Benodigde middelen	€10.000
Risico('s)	

25. Initiatieven van onderop ondersteunen

Omschrijving	De gemeente Olst-Wijhe ondersteunt /faciliteert initiatieven van onder op die bijdragen aan de biodiversiteit en klimaatadaptatie. We brengen de mogelijkheden hiervan onder de aandacht bij de kernen (kernbezoeken) en dorpsverbinders. Een voorbeeld hiervan is de deelname aan de landelijke actie 1001 hectare kruidenrijk grasland. We verwelkomen initiatieven van bewoners en begeleiden deze initiatieven met advies en waar mogelijk met een financiële bijdrage als dit initiatief bijdraagt aan de doelen zoals gesteld in het Beleidsplan Klimaatadaptatie.
Eigenaar	Beleidsuitvoerend medewerker klimaat & energie
Rol gemeente	Ondersteunende rol
Interne partners	
Externe partners	
Relatie met andere programma's/projecten	
Tijdsplanning	Doorlopend
Benodigde middelen	€5.000
Risico('s)	

26. Boomspiegelfeest en boomdeeldag

Omschrijving	We organiseren jaarlijks een actie rondom het Nationale Boomspiegelfeest, gericht op het vergroenen van boomspiegels. Hiermee stimuleren wij inwoners om samen bij te dragen aan de versterking van biodiversiteit in de openbare ruimte.
Eigenaar	Beleidsuitvoerend medewerker klimaat & energie
Rol gemeente	Ondersteunende rol
Interne partners	BOR
Externe partners	Ulebelt, Stichting Steenbreek
Relatie met andere programma's/projecten	Groenbeleidsplan
Tijdsplanning	Doorlopend
Benodigde middelen	€1.500
Risico('s)	

27. Klimaatadaptieve scholen en schoolpleinen

Omschrijving	Zodra een Integraal Huisvestingsplan (IHP) opgesteld voor de onderwijslocaties, adviseren we over te maken keuzes voor klimaatadaptatie. Eventueel breiden we de subsidieregeling klimaatadaptatie uit.
Eigenaar	Beleidsuitvoerend medewerker klimaat & energie
Rol gemeente	Ondersteunende rol
Interne partners	Beleidsmedewerker(s) onderwijs en educatie
Externe partners	Natuur voor Elkaar
Relatie met andere programma's/projecten	Uitvoeringsprogramma RIVUS, IHP
Tijdsplanning	Doorlopend
Benodigde middelen	N.v.t.
Risico('s)	

28. Verhuizen als kans

Omschrijving	Bij verhuizingen kunnen nieuwe bewoners direct worden gewezen op de kansen van klimaatadaptatie en energietransitie. Via makelaars en verhuisinformatie attenderen we hen op subsidiemogelijkheden en praktische adviezen, bijvoorbeeld voor klimaatadaptieve tuinen of zonnepanelen. Zo benutten we dit logische moment om
--------------	---

	bewoners te stimuleren hun woning en omgeving duurzaam en toekomstbestendig in te richten.
Eigenaar	Beleidsuitvoerend medewerker klimaat & energie
Rol gemeente	Ondersteunende rol
Interne partners	Cluster duurzaamheid, wonen
Externe partners	Ulebelt, SallandWonen
Relatie met andere programma's/projecten	Warmteprogramma, prestatieafspraken
Tijdsplanning	Doorlopend
Benodigde middelen	€1.500
Risico('s)	

4 Financiën

Om de ambities op het gebied van klimaatadaptatie te realiseren en de acties in hoofdstuk 3 uit te voeren, zijn middelen en capaciteit benodigd. Dit is voor het Uitvoeringsprogramma gedekt via het vastgestelde beleidsplan Klimaatadaptatie (door middel van de inzet van de CDOKE middelen).

Een aantal acties uit het Uitvoeringsprogramma kent echter PM-budgetten: nog te bepalen bedragen. Hierbij gaat het o.a. om het aanpakken van knelpunten in de openbare ruimte. Voor dergelijke incidentele financiële verzoeken geldt dat, zodra bedragen en exacte locaties concreet zijn, dit aan de raad wordt voorgelegd. Voor dergelijke acties wordt eerst gekeken naar (co)financiering binnen bestaande geraamde budgetten en externe financieringsmogelijkheden. Zo houden we de (nieuwe ronde van de) impulsregeling van het Rijk in de gaten, zodat al geplande ruimtelijke maatregelen kunnen worden uitgebreid met adaptatiemaatregelen of om nieuwe adaptatiemaatregelen op te pakken. Ook zoeken we kansen in andere financieringsmogelijkheden zoals via het Waterschap, met projecten met een Waterschapsbelang.

Tabel 1: De benodigde financiën en dekking gedurende het Uitvoeringsprogramma

Wat	2026	2027
Realiserende acties	PM	PM
Regulerende acties	€6.500,-	€6.500,-
Samenwerkende acties	€18.267,-	€18.267,-
Ondersteunende acties	€23.250,-	€30.250
Communicatie(plan) en capaciteit (4 uur p/w)	De benodigde inzet past binnen de bestaande formatie en ambtelijke uren.	De benodigde inzet past binnen de bestaande formatie en ambtelijke uren.
Totaal beschikbaar p/j	€50.000,-	€50.000
Totaal begroot	€48.017,- (exclusief communicatie)	€55.017 (exclusief communicatie)

5 Communicatie en participatie

Voor de totstandkoming van het Beleidsplan Klimaatadaptatie vroegen we inwoners via ons inwonerpanel Olst-Wijhe Spreekt met ons mee te denken over dit thema. Hiermee laten we ook zien dat klimaatadaptatie een gezamenlijke opgave is waarin iedereen een rol heeft. In dit panel gaven inwoners online hun mening over het thema klimaatadaptatie. Inwoners werd bijvoorbeeld gevraagd wat zij zelf ervaren aan hittestress of wateroverlast, welke maatregelen zij al hebben genomen en welke rol zij voor zichzelf en voor de gemeente zien in het omgaan met de gevolgen van extreem weer. De resultaten van het inwonerpanel (Bijlage 3) zijn meegenomen bij het opstellen van zowel het beleidsplan als de Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie.

Communicatieaanpak

Naast fysieke maatregelen is het stimuleren van bewustwording en gedragsverandering essentieel om de ambities van Olst-Wijhe op het gebied van klimaatadaptatie te realiseren. Voor de uitvoering van de acties uit het Uitvoeringsprogramma 2026–2028 wordt daarom een communicatieplan opgesteld. Dit plan bevat een planning voor onder meer de klimaatsubsidie, het lokale hitteplan en de actie ‘Tegel eruit, groen erin’. Maar ook goede voorbeelden lichten we uit: bij projecten in de openbare ruimte laten we zien wat er gebeurt. Dit doen we in samenwerking met team Communicatie, zodat de aanpak aansluit bij de gemeentelijke communicatie uitingen en beschikbare capaciteit.

Met het communicatieplan willen we inspelen op het vergroten van het handelingsperspectief van inwoners, bedrijven en organisaties. Dat doen we door praktische informatie, inspirerende voorbeelden en laagdrempelige ondersteuning breed onder de aandacht te brengen. Waar mogelijk werken we hierbij samen in regionaal verband, bijvoorbeeld binnen werkregio RIVUS rondom de communicatie over de klimaatsubsidie, en maken we gebruik van de basiscommunicatie van externe partners zoals Stichting Steenbreek.

De basis voor de inzet van de communicatie wordt gevormd door een communicatie- en gedragsstrategie die binnen het cluster Klimaat en Energie van het team Ruimte en Samenleving zal worden ontwikkeld. Het communicatieplan haakt daarbij aan.

6 Monitoring

De acties en maatregelen die we uitvoeren hebben als doel om Olst-Wijhe stap voor stap klimaatbestendig te maken en volgen uit het Beleidsplan Klimaatadaptatie. Monitoring helpt ons te bepalen of we op koers liggen en wat er nog nodig is om onze doelen te halen. Daarom is één van de acties uit dit Uitvoeringsprogramma het opstellen van een monitoringsdashboard. We gaan in ieder geval:

- **Monitoring van maatregelen in de openbare ruimte**
Bijhouden welke maatregelen we als gemeente hebben uitgevoerd in de openbare ruimte en wat deze hebben opgeleverd (bijvoorbeeld aantal m² vergroend oppervlak en gerealiseerde waterberging);
- **Deelname van inwoners en organisaties aan acties en subsidie**
Bijhouden hoeveel inwoners en organisaties deelnemen aan initiatieven zoals de tegeltaxi, afkoppelcoaches en de klimaatsubsidie. En we houden bij hoe veel tegels verwijderd zijn, hoe veel m² dakoppervlak is afgekoppeld en hoe veel groene daken er zijn aangelegd;
- **Effectmonitoring en (regionale) 6-jaarlijkse stresstestresultaten**
Registreren wat de effecten van de acties en maatregelen termijn zijn, zoals een vermindering van meldingen van wateroverlast en de resultaten uit de regionale 6-jaarlijkse stresstesten monitoren.

De resultaten uit deze monitoring geven ons inzicht in de effectiviteit van de acties en vormen de basis voor bijsturing in het volgende Uitvoeringsprogramma. Zo kunnen we tijdig inspelen op nieuwe kansen of knelpunten.

De tweejaarlijkse monitoring levert daarnaast belangrijke input voor de vierjaarlijkse evaluatie van het beleidsplan Klimaatadaptatie. Waar de monitoring en evaluatie van dit tweejaarlijkse Uitvoeringsprogramma zich richt op actie- en resultaatniveau, kijkt het beleidsplan naar de bredere koers en de vraag of we nog op schema liggen richting de lange termijn doelen van een klimaatbestendig Olst-Wijhe in 2050.

7 Bronnenlijst

- Bron 1. [Beleidsplan Klimaatadaptatie](#)
Bron 2. [Omgevingsvisie Olst-Wijhe 2050](#)
Bron 3. [KNMI - KNMI'23-klimaatscenario's](#)
Bron 4. [RITSEN: een gids met klimaatadaptieve instrumenten voor bouwen & ontwikkelen](#)
